Фотоотчет о реализации
проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Ненецкого автономного округа, основанных на поддержке местных инициатив, на территории МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» на 2021 год.

Объект «Благоустройство дворовой территории в районе ул. Поморской, дома № 2А-10А»

По результатам открытого электронного аукциона с ООО «ЛИДЕРСТРОЙ» заключен муниципальный контракт № 0184300000521000033 от 20.09.2021 на выполнение подрядных работ по благоустройству объекта, со сроком исполнения муниципального контракта 04.11.2021. Цена контракта составила 2 129 524,42 рублей.

Все работы на объекте, (за исключением работ по посадке цветов в вазоны по причине наступления отрицательных температур наружного воздуха) выполнены в установленный контрактом срок.

Для достижения 100 % целевых показателей результативности, в соответствии с п. 32 постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 29.05.2017 № 175-п, Администрацией МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» запланировано выполнение данных работ на летний период 2022 в срок до 1 августа 2022 года силами МКУ «Комбинат по благоустройству п. Искателей».

Всего в рамках выполнения мероприятия произведена оплата за фактически выполненные работы в сумме 2 127 550,00 рублей, из них:

- 969 100,65 руб. за счет средств окружного бюджета;
- 1 158 449,35 руб. за счет средств местного бюджета.

Кредиторская задолженность по оплате отсутствует. Экономия денежных средств в результате проведения торгов, в рамках утвержденного объема финансирования по соглашению № 16 от 19.08.2021 о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования отсутствует.

В целях завершения общего эстетического облика благоустройства территории в районе ул. Поморской, были выполнены следующие основные работы, что позволило полностью завершить объект. Это устройство дорожек из тротуарной плитки с 3Д-эффектом, устройство дворового проезда и площадок для стоянки автомобилей, озеленение (внесение земляного грунта и посадка семян травы), установка вазонов.

Работы по благоустройству производились на основании заявки и пожеланий инициативной группы. Необходимость выполнения мероприятий по благоустройству в рамках проекта обусловлена потребностью жителей всего поселка Искателей в организации комфортного благоустройства общественной территории в районе ул. Поморской. Жалоб и замечаний по качеству выполненных работ не поступало.

По окончании работ на объекте, 15.10.2021 гражданами на общественных началах были посажены деревья и кустарники, общим количеством 7 штук. Неденежный эквивалент трудового участия населения составил 23 712,69 рублей.

Поставка деревьев и кустарников на объект общим количество 7 штук, осуществлена 15.10.2021 на общественных началах ИП Кокин Сергей Александрович. Неденежный эквивалент трудового участия юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) составил 32 326,97 рублей.

Информация об объекте и о выполненных мероприятиях размещена на официальном сайте муниципального образования и опубликована в средствах массовой информации.

Ранее, в 2019 году на прилегающей к объекту территории были выполнены следующие основные виды работ: ремонт внутридворовых проездов и стоянок для автомобилей, путем устройства асфальтобетонного покрытия, уложенного на существующие дорожные ж/б плиты, устройство уширения проезжей части дороги, площадок для стоянки автомобилей из щебня, устройство плитных переходов, устройство

обочин из щебня, устройство тротуарных дорожек с площадкой для отдыха из плитки с 3Д-эффектом, установка металлических ограждений придомовых палисадников, парковых скамеек и металлических урн, устройство озеленения (внесение земляного грунта и посадка семян травы). Финансирование работ осуществлялось в рамках подпрограммы 2 «Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)» на территории МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» на 2019 год за счет средств федерального, окружного, и местного бюджетов.

Общественная территория до начала работ по благоустройству (2021 год)

Общественная территория до начала работ по благоустройству (2021 год)

Общественная территория до начала работ по благоустройству (2021 год)

Процесс производства работ (2021 год)

Процесс производства работ (2021 год)

Общественная территория после завершения работ по благоустройству (2021 год)

Общественная территория после завершения работ по благоустройству (2021 год)

Общественная территория после завершения работ по благоустройству (2021 год)

Общественная территория после завершения работ по благоустройству (2021 год)

Общественная территория после завершения работ по благоустройству (2021 год)

Трудовое участие граждан по посадке деревьев и кустарников

Трудовое участие граждан по посадке деревьев и кустарников

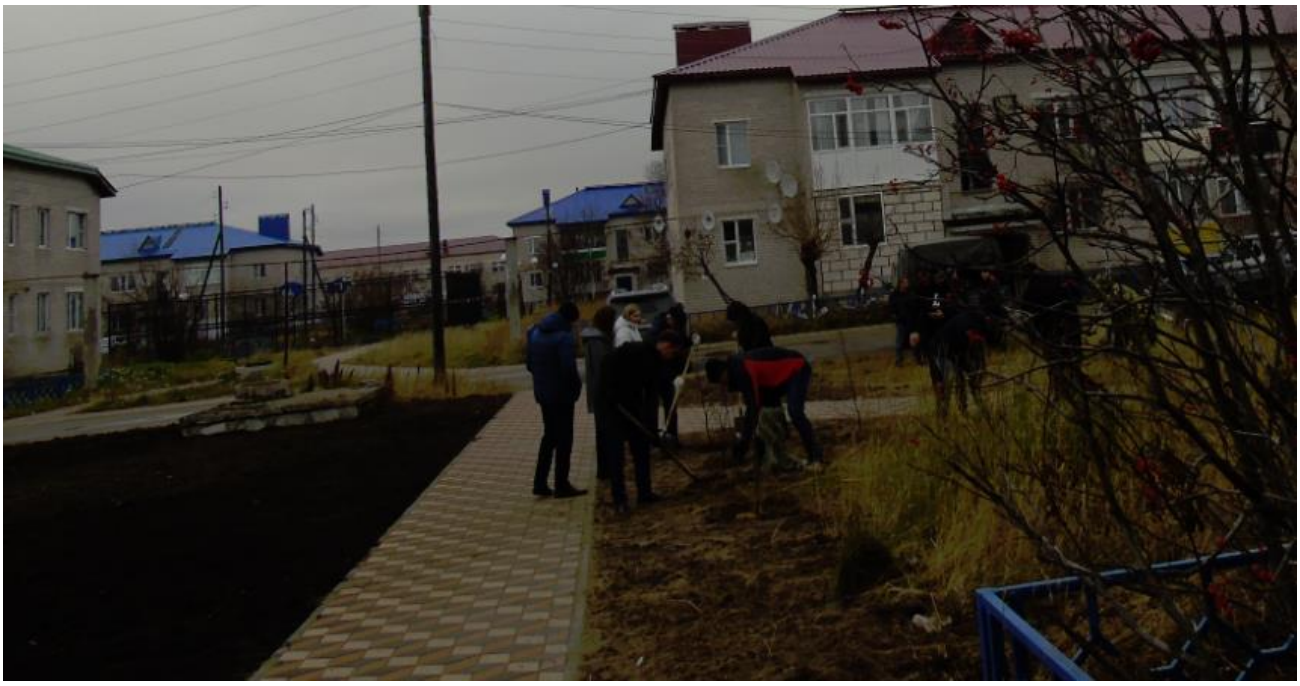

Трудовое участие граждан по посадке деревьев и кустарников

Выполнение работ по посадке цветов в вазоны (июнь 2022 год)
