Фотоотчет о реализации
проекта по поддержке местных инициатив
по соглашению № 11 от 28.04.2021 года
доп.соглашению №1 от 1.08.2022 года

подпрограммы 5 «Создание условий для развития местного самоуправления в Ненецком автономном округе» государственной программы Ненецкого автономного округа «Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации» в 2022 году

Объект «Выполнение работ по благоустройству детской игровой площадки в районе дома № 12 по ул. Поморской».

По результатам открытого электронного аукциона с ООО «ЛидерСтрой» заключен муниципальный контракт № 0184300000522000015 от 08.07.202 по благоустройству объекта, со сроком исполнения муниципального контракта 30.08.2022. Контракт исполнен 26.09.2022 г.

Всего в рамках выполнения мероприятия произведена оплата за фактически выполненные работы в сумме 2 816 853,46 рублей, из них:

- 1 499 399,81 руб. за счет средств окружного бюджета;
- 1 312 205,75 руб. за счет средств местного бюджета;
- 79 612,20 руб. вклад граждан и юридических лиц неоплачиваемым трудом;
- 5 247,90 руб. вклад граждан и юридических лиц.

Работы завершены на 100%.

На вышеуказанной территории, были выполнены следующие работы: устройство детской площадки из травмобезопасного покрытия, установка МАФ, тротуар из тротуарной плитки, устройство озеленения, посадка деревьев.

03.10.2022 14:17

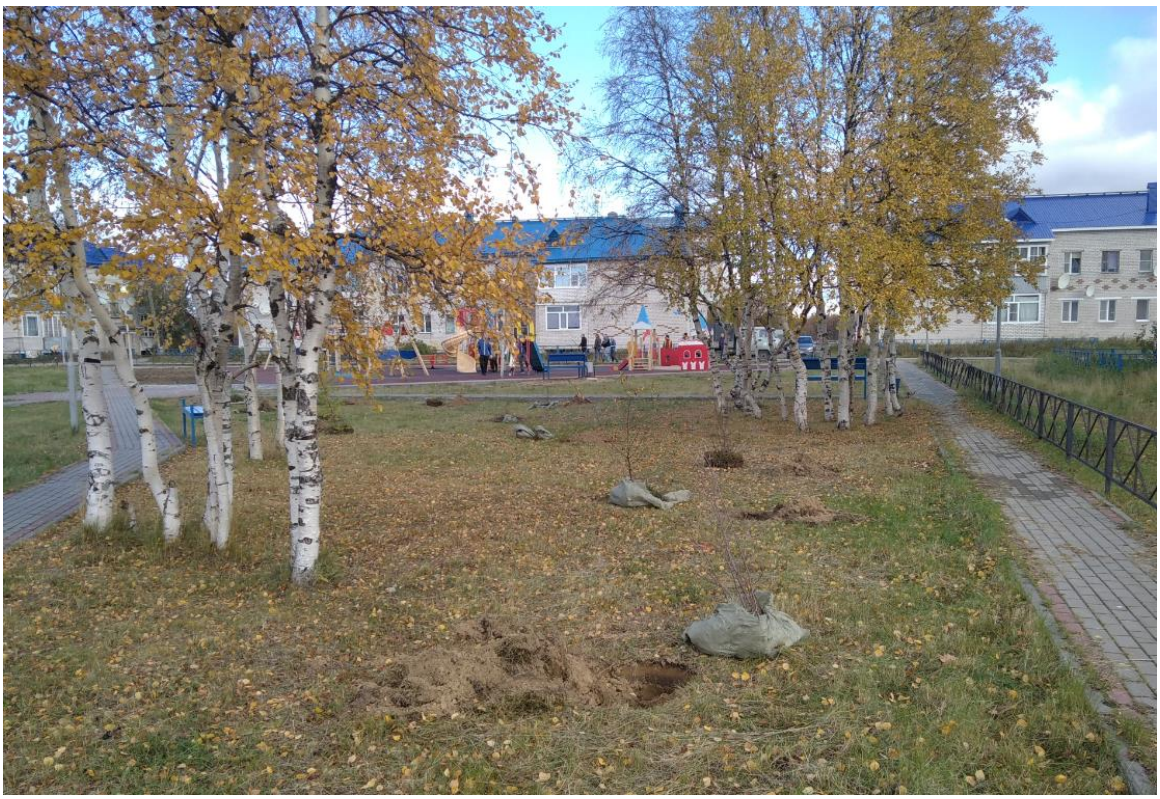

Посадка деревьев инициативной группой.
